

铜陵市突出生态环境问题整改销号备案表

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 整改问题 | 枞阳县鑫磊矿业公司废气管控不到位 | | |
| 问题来源 | 长江经济带铜陵生态环境 警示片披露 | 完成时限 | 2023 年 5 月底 |
| 整改措施 | 1、成立生态环境警示片披露问题整改领导小组。 2、全面停产，由生产班组全面恢复废气管控存在问题，设备厂家参与修复和验收，确保除尘设备正常使用。 | | |
| 目标任务 | 除尘设备全面修复，废气管控全面落实到位 | | |
| 整改 完成情况 | 1、恢复喷淋系统水泵连接，确保喷淋系统正常运行。 2、由原除尘施工单位恢复细碎筛分工序配套布袋除尘器。 3、对破碎筛分生产车间破损部位墙面更换、修复。 4、全面清理车间内设备和地面上积尘。 | | |
| 自主验收 情况 | 经 2023 年 4 月 28 日现场验收，已完成整改。 | | |
| 公示情况 | | | |
| 审核意见 | 整改实施主体主要负责同志意见： 主要负责人签字： (盖章) 2023 年 5 月 11 日 | | |
| 备注 | | | |

附件

枞阳县 2022 年第四季度长江经济带铜陵生态环境警示片披露问题整改整改措施清单

| 序号 | 具体问题 | 整改措施 | 整改标准 | 责任单位 | 监管单位 | 整改时限 | 备注 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|------|----|
| 1 | 枞阳县鑫磊矿业公司废气管控不到位。该公司采场破碎环节喷淋系统没有连接水泵，喷淋抑尘装置形同虚设。细碎筛分工序配套布袋除尘器停用，引风机和排气筒已被拆除。破碎筛分车间全封闭措施落实不到位，车间部分破损未及时修复，设备和地面积尘较重。 | | | 县经信局 雨坛镇政府 | 市经信局 | | |

2022 年第四季度长江经济带铜陵 生态环境警示片披露问题 现场核实检查

矿山名称：枞阳县枫冲采石场

检查时间：2023 年 3 月 7 日

披露问题：枞阳县鑫磊矿业公司废气管控不到位。该公司采场破碎环节喷淋系统没有连接水泵，喷淋抑尘装置形同虚设。细碎筛分工序配套布袋除尘器停用，引风机和排气筒已被拆除。破碎筛分车间全封闭措施落实不到位，车间部分破损未及时修复，设备和地面积尘较重。

核实情况：

1. 警示片反映的问题属实。

2. 经现场检查，发现矿区内河流边未及时的治理。

3. 矿区内道路道路扬尘严重。

整改情况：

1. 矿区内立即制定整改方案，明确整改期限，整改责任人，整改责任人。

2. 举一反三，对全矿进行环境整改专项检查，并对发现的问题及时整改到位。

检查人员：

李元平 李元平 李元平 李元平 李元平 李元平 李元平 李元平 李元平 李元平

枞阳县鑫磊矿业有限公司文件

枞鑫矿字〔2023〕006号

关于成立长江经济带铜陵生态环境警示片披露问题 整改领导小组的通知

公司各科室、各班组：

根据枞阳县 2022 年第四季度长江经济带铜陵生态环境警示片披露问题，我公司枞阳县雨坛乡枫冲采石场为尽快完成整改，经公司研究决定，成立枫冲采石场整改领导小组：

组 长：杨玉鑫

副组长：王长桂

组 员：何德才、杨其凌、徐成刚、朱守林

附：枞阳县雨坛乡枫冲采石场整改情况表

枞阳县鑫磊矿业有限公司

2023年3月8日



附件




枞阳县2022年第四季度长江经济带铜陵生态环境警示片披露问题 枞阳县雨坛乡枫冲采石场整改情况表

| 具体问题 | 整改措施 | 整改标准 | 责任人 | 验收人 | 整改时限 | 备注 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----|
| 问题一：采场破碎环节喷淋系统没有连接水泵，喷淋抑尘装置形同虚设。 | 1、恢复喷淋系统水泵连接，确保喷淋系统正常运行。 2、增加入口皮带悬挂。 | 正常使用 | 杨其凌 | 何树才 徐成刚 | 2023年4月31日 | |
| 问题二：细破碎分工序配套布袋除尘器停用，引风机和排气筒已被拆除。 | 1、由原除尘施工单位恢复细破碎分工序配套布袋除尘器。 2、组织生产科和除尘设备厂家对所有除尘设备进行全面排查，确保所有设备符合使用要求。 | 正常使用 | 徐成刚 | 何树才 徐成刚 | 2023年5月31日 | |
| 问题三：破碎筛分车间全封闭措施落实不到位，车间部分破损未及时修复，设备和地面积尘较重。 | 1、对破碎筛分生产车间破损部位墙面更换、修复。 2、全面清理车间内设备和地面上积尘。 3、落实车间粉尘常态化清理、管控。 | 车间整洁 | 杨其凌 | 何树才 徐成刚 | 2023年5月31日 | |



整改后：筛分车间破损已全部修复

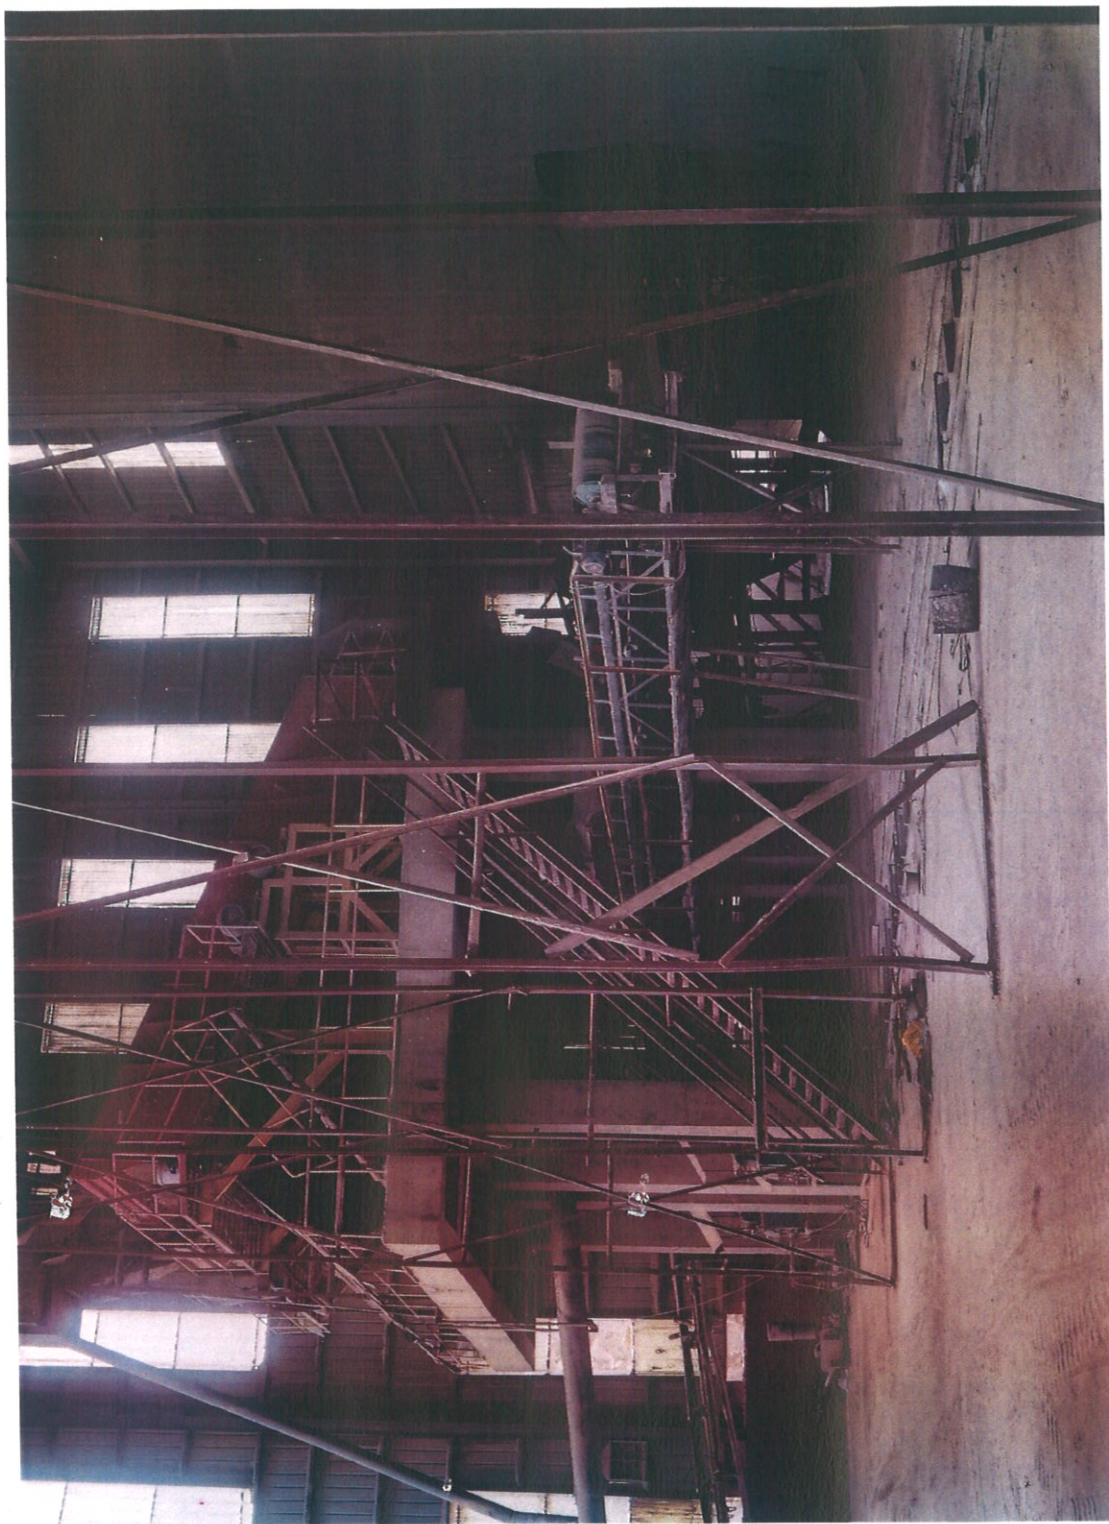

整改后：设备和地面除尘已全面清理



整改后：设备和地面除尘已全面清理



除尘管连接管



整改后：除尘管连接管已修复



除尘管连接管分开

除



整改后：尘管连接管连接



整改后：筛分车间破损已全部修复
